

# 池州市贵兴非矿新材料有限公司

池贵兴非矿字〔2023〕4号

## 整改报告

贵池区应急管理局：

2023年01月04日，贵局对我公司进行排查中发现存在的隐患问题，我司高度重视，立即安排逐条落实整治各项要求，现将整改任务完成情况汇报如下：

整改负责人：戴泽忠

完成整改时间：2023年02月02日

整改落实情况如下：



池州市贵兴非矿新材料有限公司

2023年02月03日



扫描全能王 创建

一、煤磨车间磨煤机电缆接口未封堵，在磨机 3 米区域范围内存在非防爆插座。

整改措施：及时安排人员对电缆接口堵塞，现场非防爆插座立即收起，加强现场安全管理，杜绝类似事件再次发生。

完成时间：2023 年 01 月 05 日

完成情况：已完成（见附件 1-4）



整改前



整改后







整改前



整改后




二、煤粉仓设置了氮气保护，但氮气气瓶及阀门管道处于关闭状态（手动），未见报警、联锁保护系统。


整改措施：将现场手动改为自动状态。

完成时间：2023 年 02 月 03 日

完成情况：已完成（见附件 5-9）

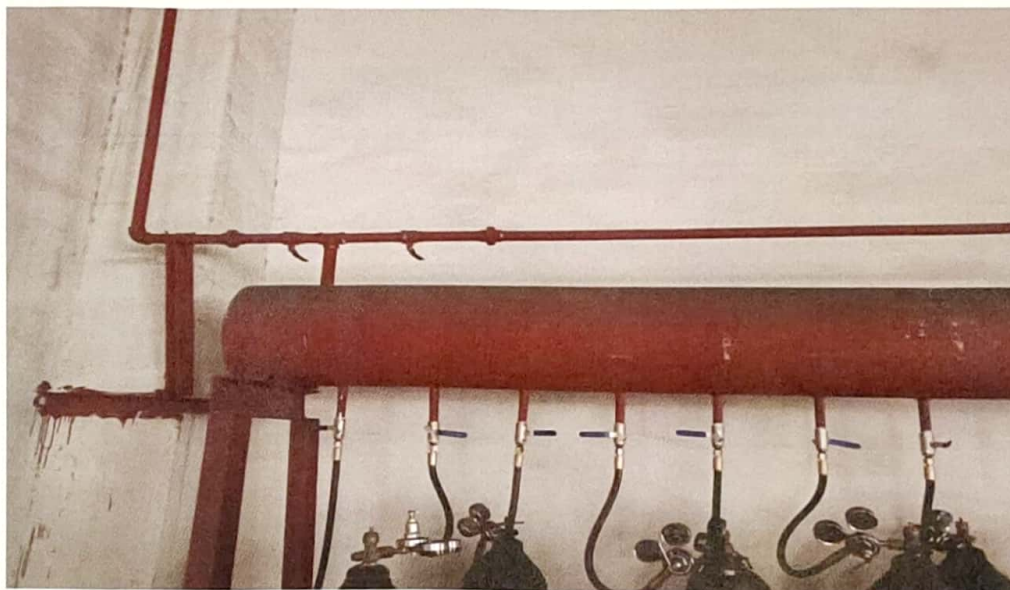

整改前

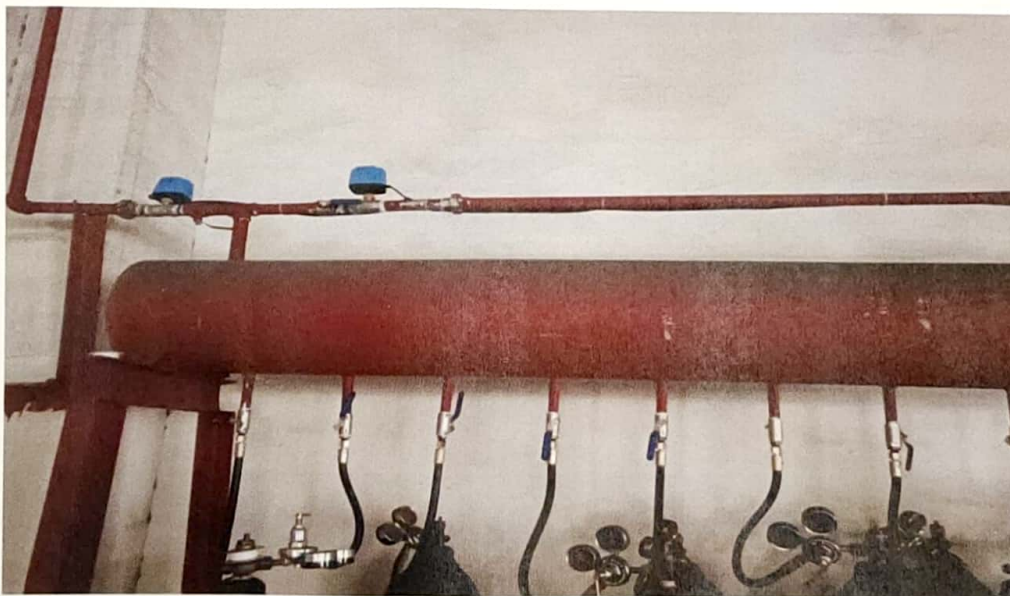

整改后







整改前



整改后



整改后



三、立窑一氧化碳报警装置处于不适用状态，未见一氧化碳报警装置点位布置图，未见一氧化碳报警处置流程图。

整改措施：现场一氧化碳报警仪及时检查维修，处于正常运行状态，控制室一氧化碳报警装置点位布置图已安装好，报警处置流程图已粘贴。

完成时间：2023 年 01 月 08 日

完成情况：已完成（见附件 10-12）



整改后







整改后



整改后



三、有限空间已辨识但未见提升机人孔处等有限空间告知牌。

整改措施：对提升机人孔现场粘贴有限空间告知牌

完成时间：2023 年 01 月 07 日

完成情况：已完成（见附件 13-15）



整改前



整改后







整改后

四、立窑现场存在异地技改项目施工（交叉作业）未见现场安全管理  
人员旁站。

整改措施：加强对施工现场安全管理，确保无事故发生。

完成时间：2023 年 01 月 05 日

完成情况：要求负责人作业时必须在现场指导，加强对施工现场  
作业安全必须监管到位。



扫描全能王 创建
